

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Werkausschusses Abwasserentsorgung/Umweltdienste
vom 26.06.2024

öffentlich

TOP 9 Sachstandsbericht Neubau Schlammmentwässerung VO/2024/084 zur Kenntnis genommen

Herr Heers berichtet anhand einer ausführlichen Präsentation zu seinem Thema. Die Drainage für den Neubau der Schlammmentwässerungsanlage ist gelegt. Als nächstes kommen die Betonfertigteile aus Schwerin, die derzeit dort am Aushärten sind. Geplant ist, dass diese Fertigteile in den folgenden drei Wochen fertiggestellt sind. Das Projekt befindet sich im Zeit- und Budgetplan.

Herr Thiesen erkundigt sich, ob die Kosten umlagefähig sind und die AfA-Beträge berücksichtigt wurden.

Herr Wolfgramm erklärt, dass im Wirtschaftsplan eine Gebührenerhöhung eingeflossen ist. Es hängt davon ab, wie hoch die Kosten tatsächlich werden.

Herr Sethe erkundigt sich, ob es sich bei dem Transport der Fertigbetonteile von Schwerin nach Schleswig um Spezialtransporte handelt.

Herr Heers führt aus, dass es sich um normale Straßentransporte handelt. Die ausführende Firma hat dafür eigene Transportfahrzeuge. Das schwerste Teil wiegt 16,5 Tonnen. Insgesamt liegen in Schwerin 1.300 Tonnen in 135 Einzelteilen.

Der Auszug entspricht dem Originalprotokoll.



TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammentwässerung

/ Überblick

- / Baustelleneinrichtung - Februar 2024
- / Spitzendrucksondierung / Baugrunduntersuchung
- / Auffüllen des Geländes / Herstellung Grobplanum (zuk. GOK 10,70 m NHN)
- / Verfüllen alter Leitungen und ungenutzter Schächte
- / Beginn der Tiefbaumaßnahmen
- / Einbau Schmutzwasserpumpwerk
- / Herstellen der Sauberkeitsschichten abgeschlossen
- / Fertigteile in Produktion

TOP 8 Sachstandbericht Neubau Schlammwässerung




TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammmentwässerung



TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammmentwässerung



TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammmentwässerung

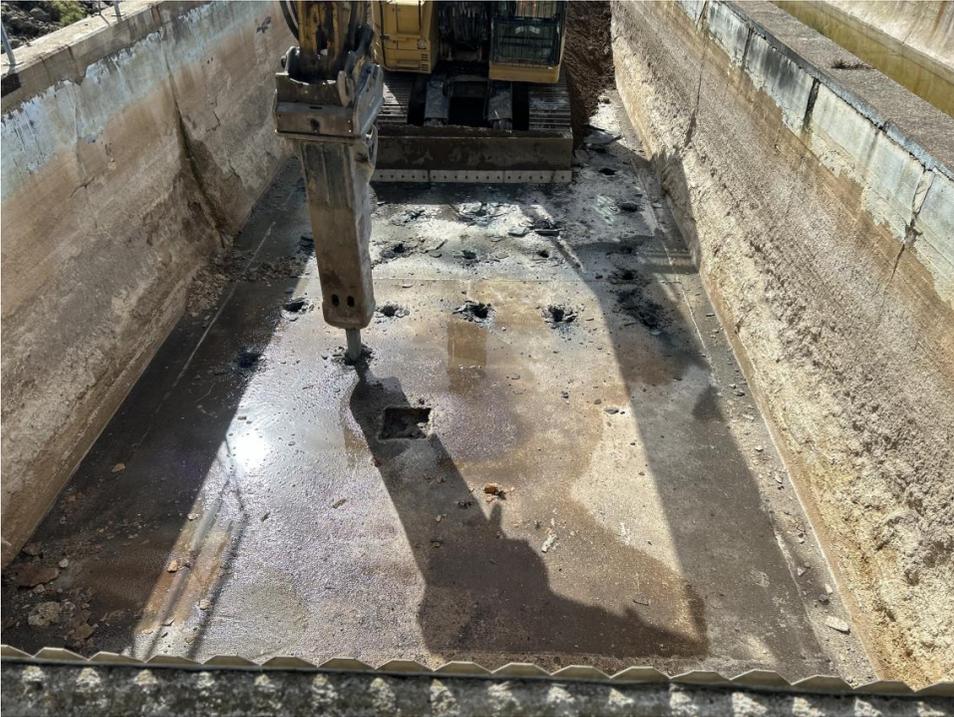

TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammmentwässerung



TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammmentwässerung



TOP 9 Sachstandbericht Neubau Schlammentwässerung

/ **Ausblick**

- / Aufstellung Fertigteile – ab 01.07.2024
- / Betonage der Ortbetonteile – August / September
- / Rohbauabnahme – Oktober
- / Maschinentechnische Ausrüstung – Januar 2025
- / Aufstellung Hochsilo – Februar 2025
- / Elektrotechnische Ausrüstung – Februar 2025
- / Inbetriebnahme – September 2025

/ **Derzeit im Zeit- und Budgetplan**



Danke.

/ Für Ihre Aufmerksamkeit
